



EIROPAS
DZELZCEĻA
LĪNIJAS

PROGRESS UN IZAICINĀJUMI RAIL BALTICA IEVIEŠANĀ LATVIJĀ

07.12.2017



Projekta ieviesēji

Labuma guvēji

- ⦿ Igaunijas Republikas Ekonomikas lietu un sakaru ministrija
- ⦿ Latvijas Republikas Satiksmes ministrija
- ⦿ Lietuvas Republikas Ekonomikas lietu un sakaru ministrija




Koordinatori un ieviesējs

RB Rail

- ⦿ Rail Baltic Estonia OU
- ⦿ Estonian Technical Regulatory Authority
- ⦿ Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA
- ⦿ Rail Baltica statyba UAB
- ⦿ Lietuvos geležinkeliai JSC

Nacionālie ieviesēji

Atbildības sadalījums

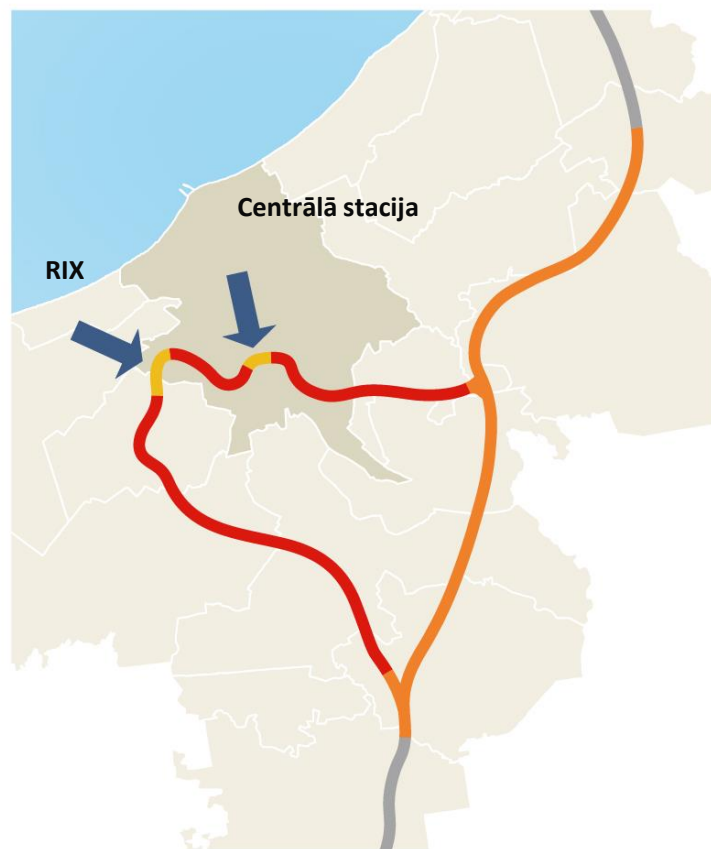

Uzdevums	RBR	EDzL
Būvprojekts	Pamata trase	Centrālā stacija, RIX
«NoBo»	✓	✓
Būvekspertīze	✓	✓
Īpašumu atsavināšana	✗	✓
Arheoloģiskā izpēte	✗	✓
Būvdarbi	Pārrobežu sekcijas, Signalizācija, ERTMS	Pamata trases un punktveidu objektu būvniecība

Projekta progress

2016

- Īpašumu atsavināšanas plāns
- Tehnisko risinājumu novērtēšana

- Centrālā stacija
- RIX
- LV centrālā daļa

- Centrālā stacija
- RIX
- Centrālās daļas 1 kārta

- Īpašumu atsavināšanas plāna izstrāde

Pētījumi

Projektēšana

Būvdarbi

Atsavināšana

2017

- **Izstrādāts** - Īpašumu atsavināšanas plāns
- **Sagatavoti** sākotnējie tehniskie risinājumi projektēšanas uzsākšanai
- **Veikta** Klientu apmierinātības aptauja
- **Pabeigta** izpēte par RB ietekmi un aeronavigācijas sistēmu
- **Uzsākta** kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte

- **Izsludināts** iepirkums Centrālā stacija
- **Izsludināts** iepirkums RIX
- LV Centrālā daļa – AS «RB Rail» kompetence

- **Izsludināts** D&B iepirkums par Centrālo staciju, uzbērumu un tiltu, centrālo daļu

- **Noslēgti** līgumi ar Nekustamo īpašumu vērtētājiem un mērniekiem
- **Uzsākta** atsavināšana RIX un CS teritorijās

RĪGAS CENTRĀLĀ STACIJA





Dzelzceļa stacija



Multimodāls transporta mezgls

Mērķis:

- Esošās dzelzceļa stacijas pārbūve integrējot Rail Baltica dzelzceļu
- Rail Baltica tilta pār Daugavu izbūve
- Kompleksa Rīgas centra attīstība

Sagatavošanās D&B uzsākšanai



Starptautisks metu konkurss

Novembris, 2016

Starptautiska žūrija piešķir divas otrās godalgas

Marts, 2017

Pieņemts lēmums turpināt darbu ar PLH Arkitekter iesniegto metu



Izsludināts iepirkums

25.aprīlis, 2017

Izsludināta iepirkuma 1. kārtā ar iesniegšanas termiņu 25/07/17



Sūdzības

20.jūlijs, 2017

IUB iesniegtas 4 sūdzības

8.septembris, 2017

IUB atļauj turpināt iepirkuma procedūru



Piedāvājumu vērtēšana


12.septembris, 2017

Saņemti 7 starptautisku apvienību piedāvājumi


Decembris, 2017

Pabeigta piedāvājumu vērtēšana

2018, I cet. iepirkuma 2.kārtas dokumentācijas izstrāde un izsludināšana

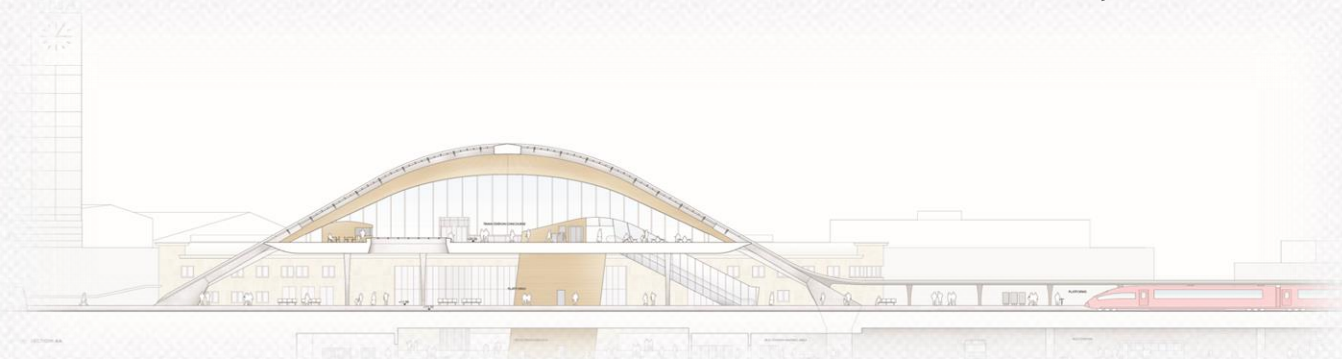

Projektēšana un būvdarbi

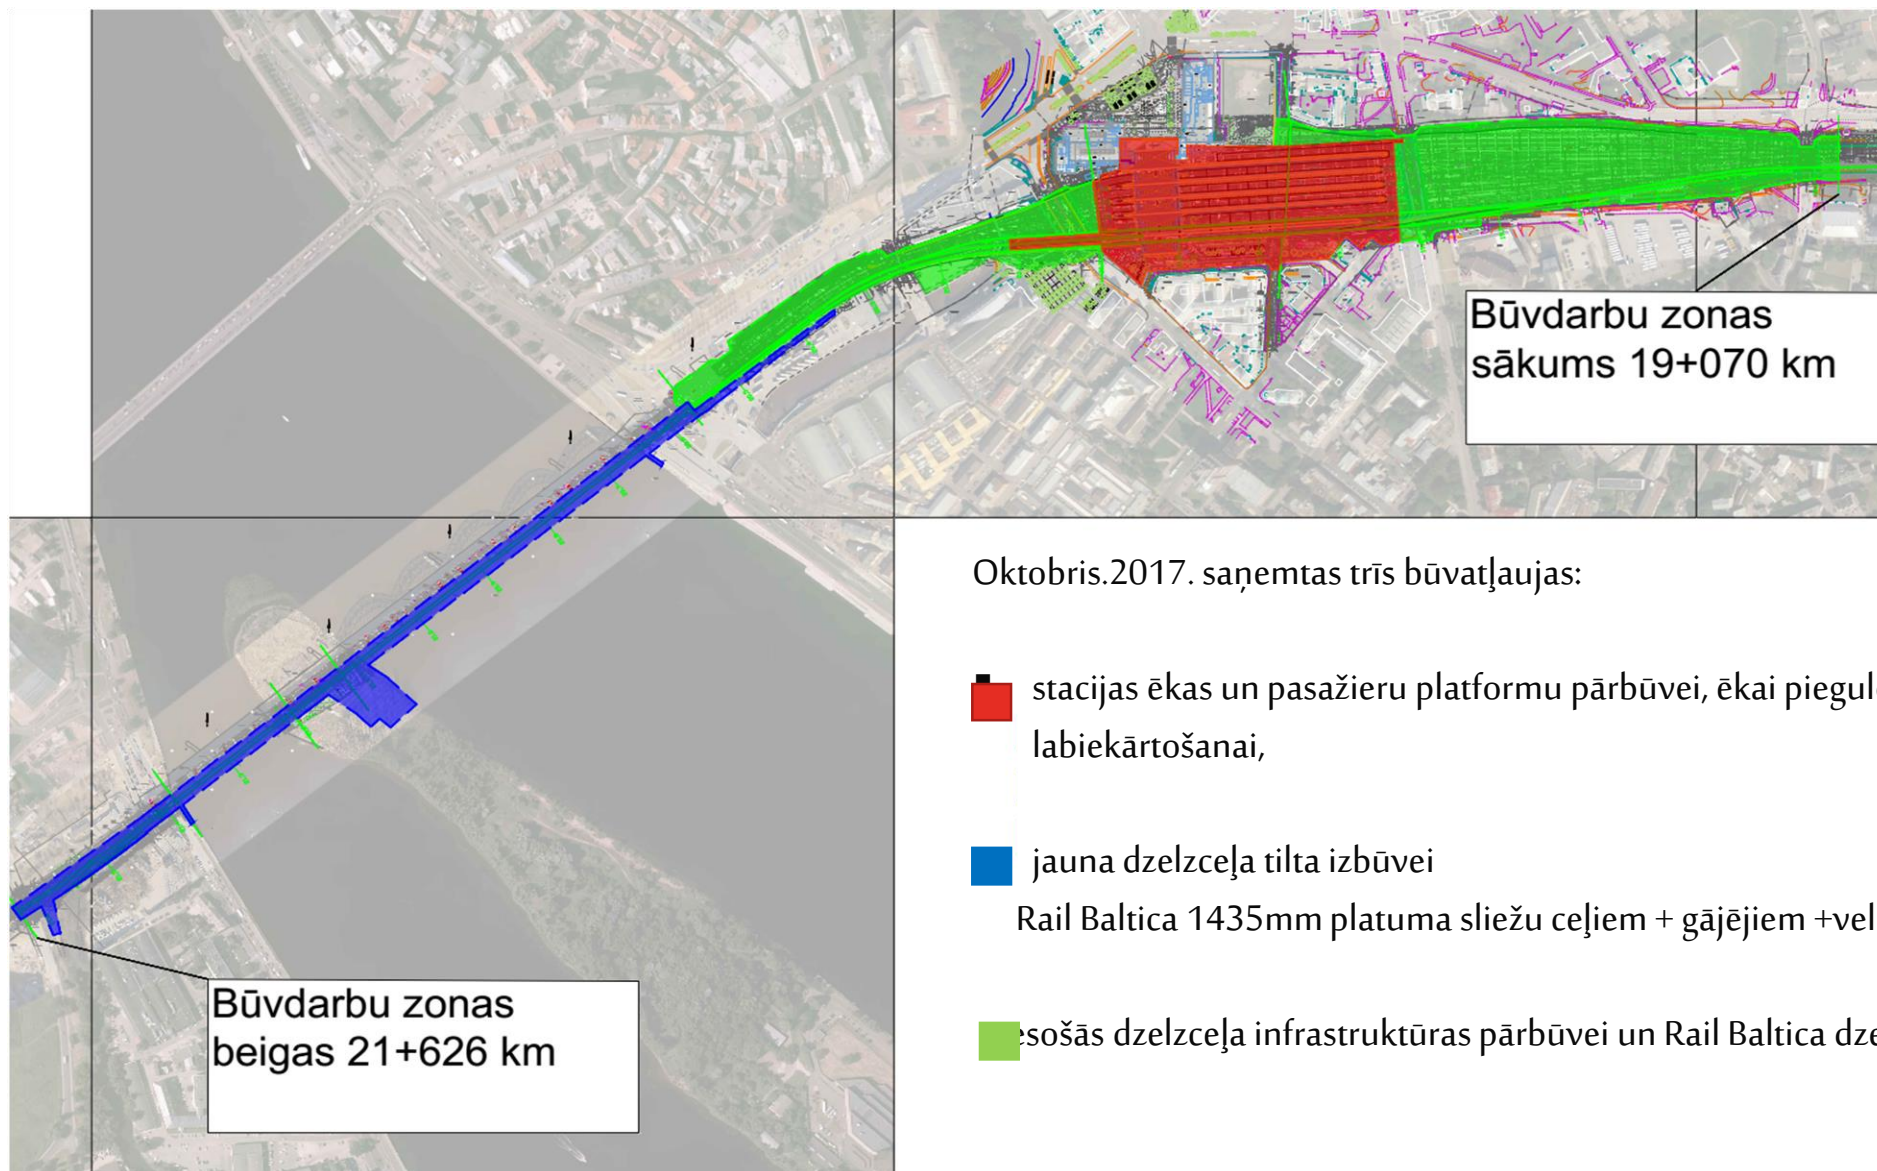

Laika grafiks



leguvumi pilsētvides uzlabošanai

- Sakārtota abu platumu dzelzceļa **pasažieru apkalpošana** – uzgaidāmās telpas, vides pieejamība, paplašināti gājēju tuneļi zem dzelzceļa sliedēm
- Jauns **Elizabetes un Timoteja ielu savienojums**
- Vizuāli un funkcionāli **savienotas divas pilsētas puses**, norokot uzbērumu posmā no Timoteja ielas līdz Gogoļa ielai un no Prāgas ielas līdz Kungu ielas pagarinājumam
- Jauns **gājēju un velosipēdistu savienojums** no pilsētas centra uz Pārdaugavu
- Sakārtota, **pievilcīga stacijas D ieeja**
- Uzlabota **publiskā ārtelpa**
- **Jauniegūtas teritorijas** norakto uzbēruma daļu vietā





- Noslēgusies iepirkuma Pirmā kārtā
- Izsludināta Otrā iepirkuma kārtā
- Līgums 2018.gada I ceturksnis
- Izpildes termiņš - 17 mēneši
- 2019 gadā iepirkums būvdarbiem
- Nekustamā īpašuma atsavināšana līdz būvdarbu sākumam

**Vienlaikus noris darbs pie Lidostas 6 kārtas attīstīšanas. Saņemti 5 pieteikumi, noris darbs pie to izvērtēšanas.*

Iepirkumi 2018



Projektēšanas un Būvdarbu saistītie iepirkumi

» Būvprojektu ekspertīze


Visi projekta objekti ir 3.grupas būves, kurām ir obligāta būvprojekta ekspertīze

» «NoBo»

Verificēšanu veic, lai pierādītu, ka saistībā ar attiecīgo apakšsistēmu ir izpildītas noteikumu prasības un to drīkst nodot ekspluatācijā Eiropas dzelzceļa sistēmā

» FIDIC inženieri + Būvuzraudzība

Eksperts nav soģis, bet palīgs un konsultants – vēl viens acu pāris, kas aplūko projektu

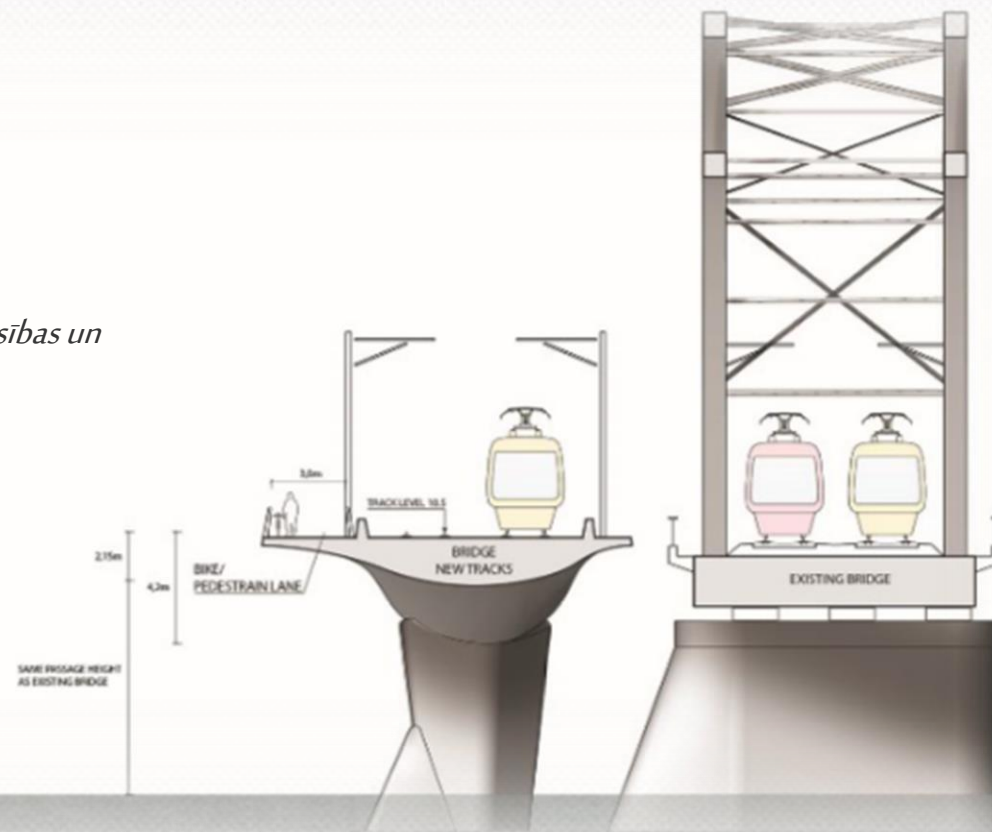

Būvniecības fāze



Būvdarbu iepirkumi 2019. – 2021. gads



Kopējas projekta izmaksas LV 1,9 miljardi eiro



Iepirkumi vairākās ģeogrāfiskās un inženiertehniskās kārtās ar aptuveno līgumcenu 300 milj. eiro



Būvdarbu pabeigšanas laiks – 2026. gads

- Darbaspēka pieejamība un izmaksas
- Nozares dinamika un elastība
- Standarti un kvalitāte būvniecībā
- Resursu kompleksa pieejamība
- **Sadarbība vs Konkurence**



PALDIES PAR UZMANĪBU!



✉ Maskavas iela 12, Rīga
LV1050, Latvija

✉ info@edzl.lv

🌐 www.edzl.lv
